



# Cartera de proyectos TI 2019

## Informe 4º cuatrimestre (cierre)

*ATICA – Universidad de Murcia*

*Enero de 2020*



1.	Introducción.....	3
2.	Fechas de interés.....	3
3.	Procedencia y tipología de las SOLICITUDES .....	4
	Total solicitudes.....	4
	Solicitudes de proyectos de desarrollo de software vs Infraestructuras .....	4
	Solicitudes por tipo de promotor principal .....	5
	Solicitudes por promotor (Consejo de Dirección).....	5
	Solicitudes por promotor (Decanatos) .....	6
4.	Resultado de la APROBACIÓN de la cartera .....	7
	Proyectos nuevos aprobados vs solicitados .....	7
5.	Estado de la Cartera de proyectos TI 2019 al cierre (31 de enero de 2020) .....	8
	Grado de ejecución.....	8
	Estado de los proyectos al cierre (31 de enero de 2020).....	8
6.	Detalle al cierre de los proyectos del Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodologías.....	10
7.	Detalle al cierre de los proyectos del Servicio de Infraestructuras .....	11



## 1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo mostrar el estado de los proyectos correspondientes a la *Cartera de proyectos TI (PORTICO)* de la convocatoria 2019.

El período considerado para la realización de los proyectos aprobados es el comprendido entre el 1 de febrero del año correspondiente a la convocatoria, en este caso 2019 y el 31 de enero del año siguiente, en este caso 2020.

Todas las tablas y gráficos que se presentan en el apartado 3, 4 y 5 de este informe, hacen referencia, exclusivamente, a lo solicitado y, en su caso, aprobado dentro de la Cartera de proyectos PORTICO. Por otra parte, lo mostrado en los apartados 6 y 7, hacen referencia a la ejecución real del ejercicio, ya que a lo largo de éste la cartera ha sufrido variaciones debido a diferentes causas, como son la incorporación de remanentes, financiación adicional, cumplimiento normativo, etc.

## 2. Fechas de interés

A continuación, un resumen de las principales fechas relevantes de la convocatoria.

- ✓ 19 de septiembre de 2018. Anuncio por parte del Delegado del Rector para la Universidad Digital (CIO) de la apertura de la convocatoria.
- ✓ 10 de octubre de 2018. Plazo límite de solicitud (ampliación del plazo inicial 7 de octubre).
- ✓ 28 de octubre de 2018. Fecha límite para presupuestación por parte de responsables técnicos y valoración por parte del CIO.
- ✓ 14 de noviembre de 2018. Aprobación de la propuesta de *Cartera de proyectos TI 2019* por parte del Comité de Estrategia de Gobierno TI de la Universidad de Murcia.
- ✓ 22 de noviembre de 2018. Presentación de la *Cartera de proyectos TI 2019* por parte del Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital al Consejo de Dirección de la Universidad de Murcia para su aprobación definitiva.
- ✓ 3 de diciembre de 2018. Ajuste de la *Cartera de proyectos TI 2019* por parte del Comité de Dirección de Gobierno TI tras la aprobación definitiva del PRESUPUESTO 2019.




### 3. Procedencia y tipología de las SOLICITUDES

*Total solicitudes*

Mantenimiento de aplicaciones y servicios existentes	83
Nuevos proyectos software o infraestructuras	197



*Solicitudes de proyectos de desarrollo de software vs Infraestructuras<sup>1</sup>*

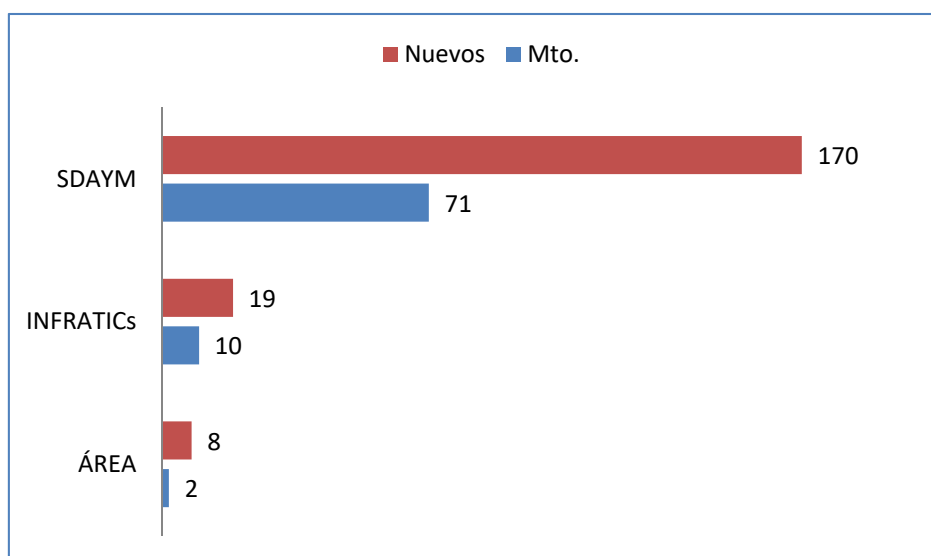


<sup>1</sup> SDAYM. Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodologías  
INFRATICS. Servicio de Infraestructuras  
ÁREA. Proyectos transversales que afectan a ambos servicios




### Solicitudes por tipo de promotor principal

Consejo de Dirección	167
Decanatos	30

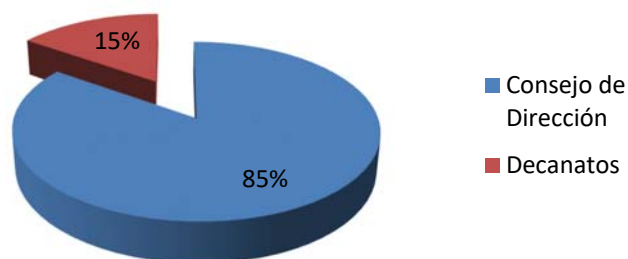


### Solicitudes por promotor (Consejo de Dirección)

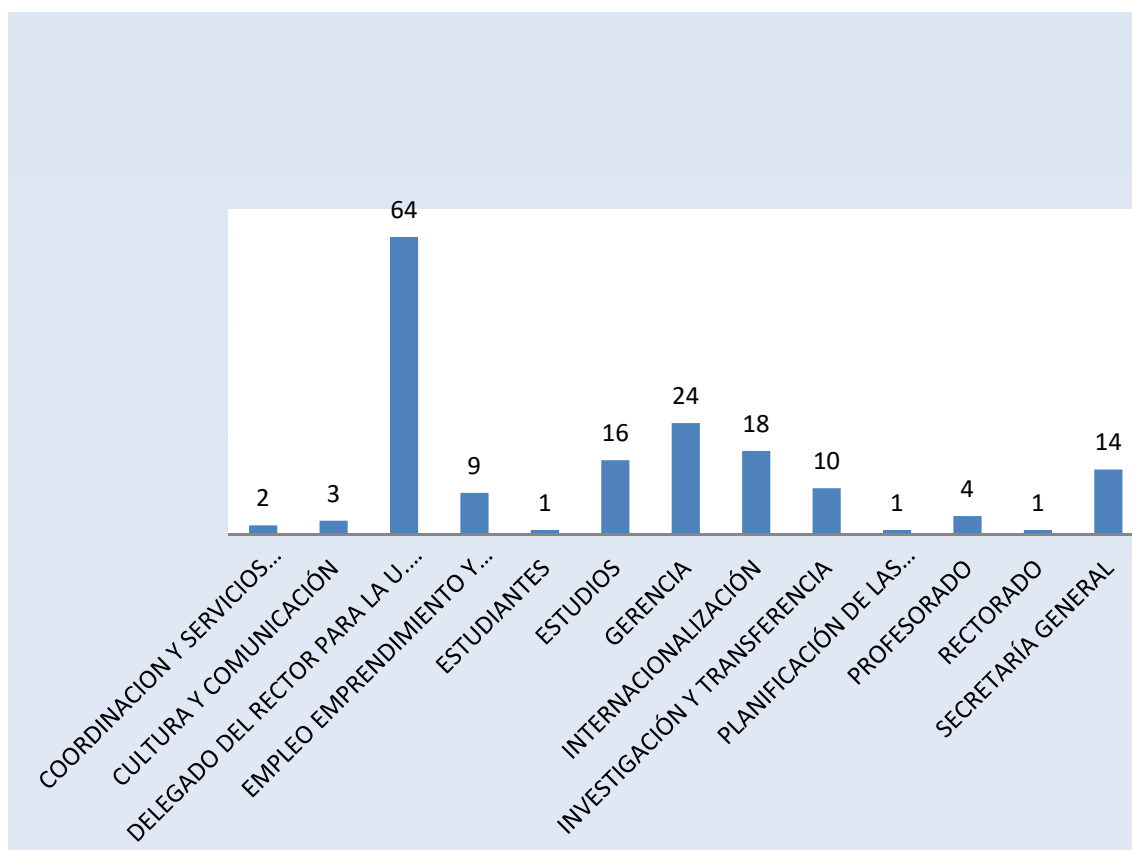



*Solicitudes por promotor (Decanatos)*

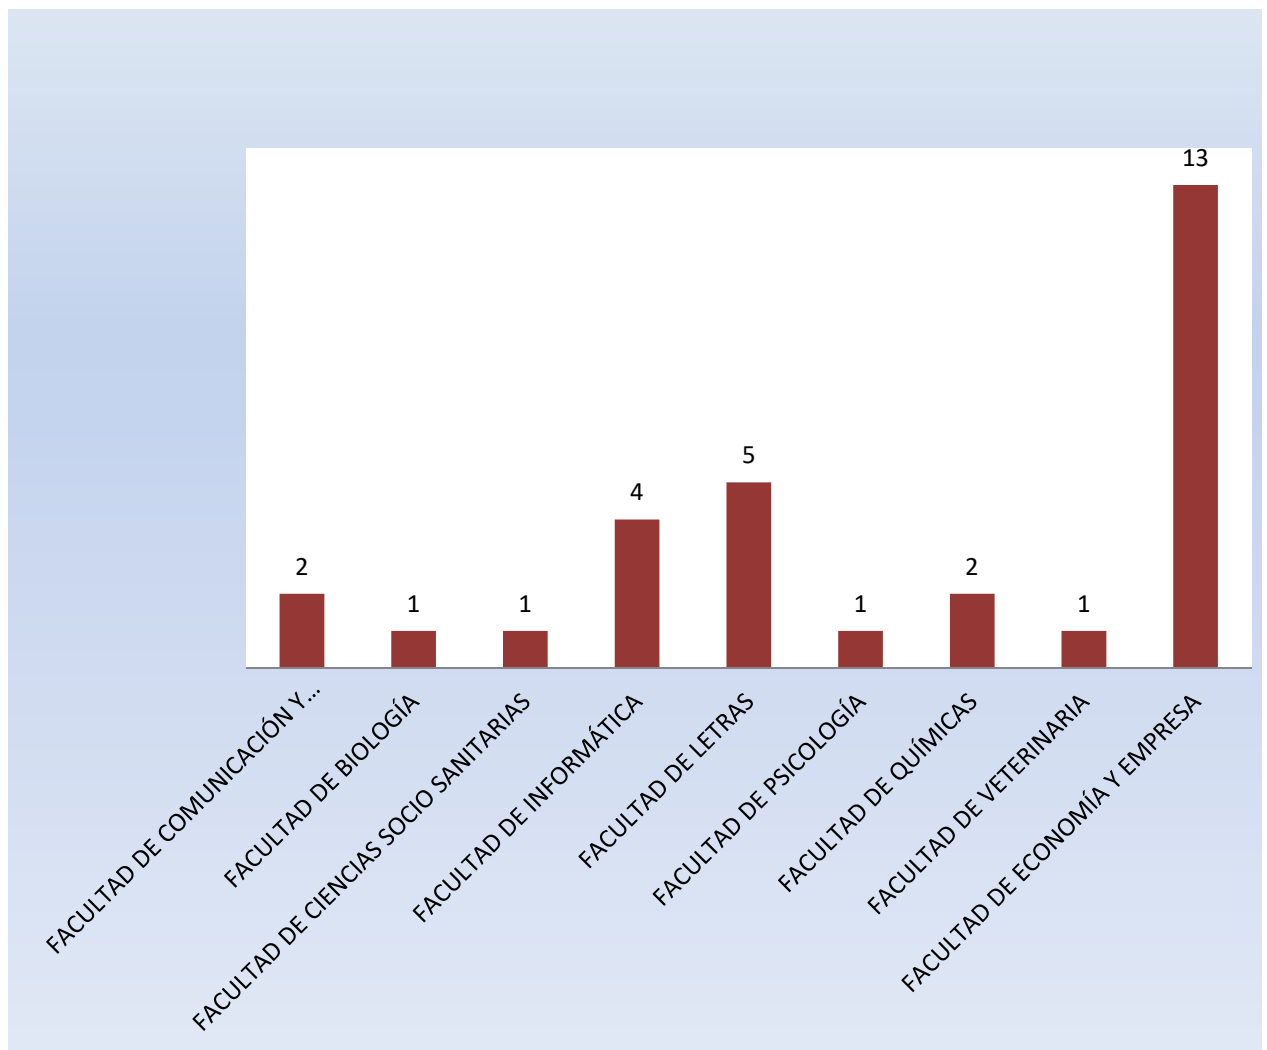




#### 4. Resultado de la APROBACIÓN de la cartera

##### *Proyectos nuevos aprobados vs solicitados*


El gráfico que se muestra a continuación hace referencia a los proyectos NUEVOS, ya que los MANTENIMIENTOS se aprueban en su totalidad.

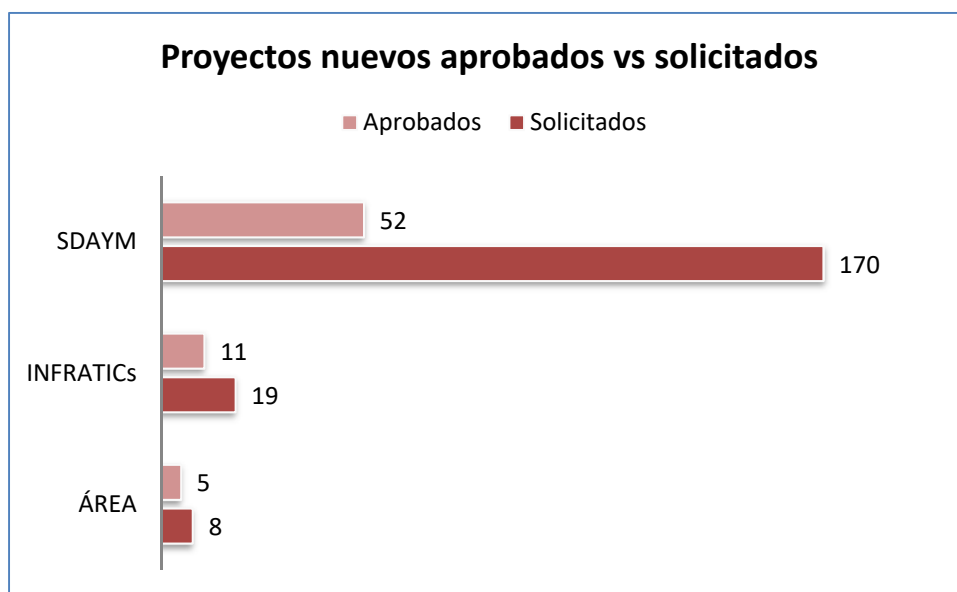



## 5. Estado de la Cartera de proyectos TI 2019 al cierre (31 de enero de 2020)

### Grado de ejecución

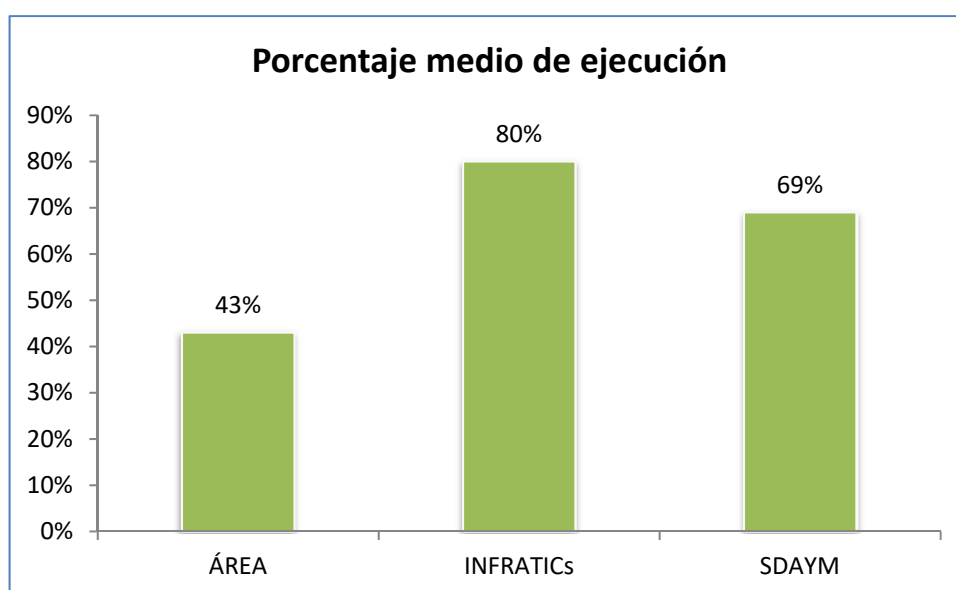

### Estado de los proyectos al cierre (31 de enero de 2020)









### Proyectos de INFRATICs

- Finalizados
- Iniciados, no finalizados
- Dados de baja
- Finalizado alcance 2019 (plurianual)
- No iniciados





### Proyectos del SDAYM

- Finalizados
- Iniciados, no finalizados
- Dados de baja
- Finalizado alcance 2019 (plurianual)
- No iniciados

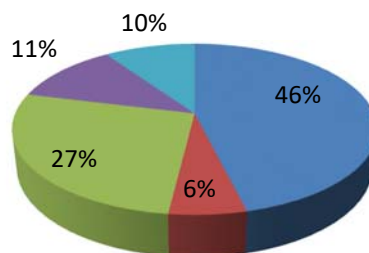



## 6. Detalle al cierre de los proyectos del Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodologías<sup>2</sup>

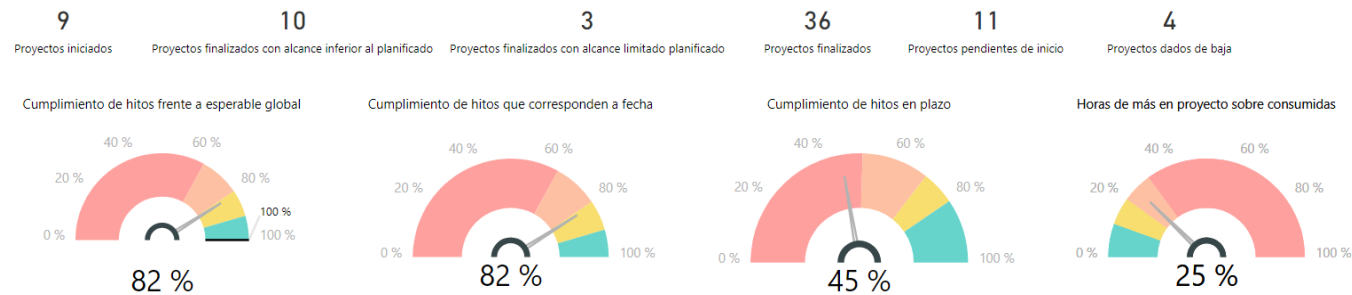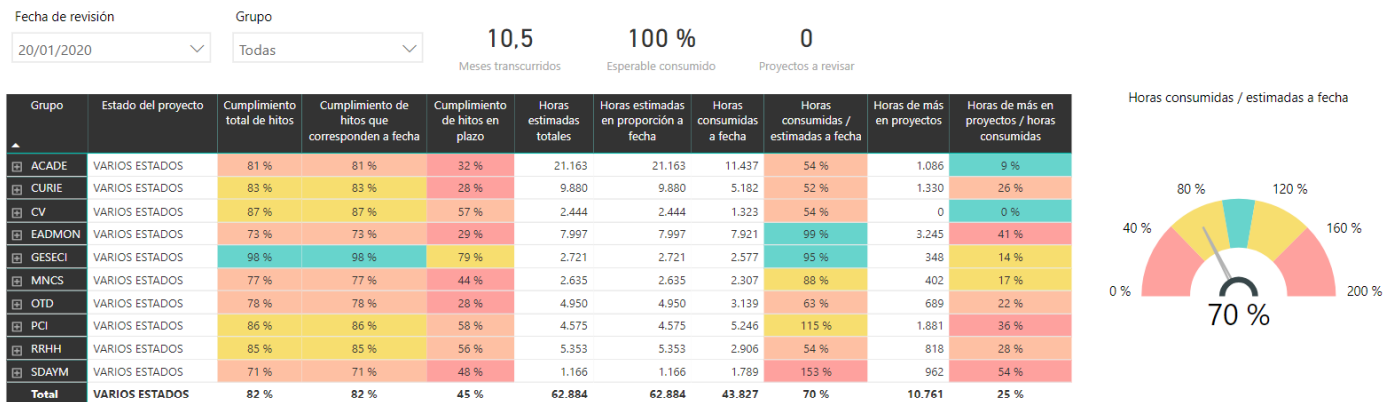

<sup>2</sup> URL de acceso al cuadro de mandos: [Cuadro de mandos 2019 del SDAYM](#)



## 7. Detalle al cierre de los proyectos del Servicio de Infraestructuras

### ÁTICA Servicio de Infraestructuras TIC Evolución de Proyectos – Año 2019 Datos a 5 de Febrero de 2020

Grado global de cumplimiento **92,22 %**

	Proyecto	Estado	% cumplimiento	Comentarios	
Infraestructura general	Inversiones en el centro de datos secundario en Fuente Álamo	No iniciado	0,00 %		
	Proyectos Previstos (Pptos. iniciales 2019)	Aumentar capacidad de la red del centro de datos principal	Finalizado	100,00 %	Falta formación
		Renovación Infraestructura de backup	En marcha	50,00 %	En fase de preadjudicación. No se adjudicará hasta 2020.
		Infraestructura de servidores hiperconvergentes	En marcha	80,00 %	Adjudicado el 12-nov-2019. Suministro con rotura de stock. Entrega prevista: mediados de febrero de 2020.
	Nuevos proyectos (Incorporaciones presupuestarias 2019)	Conectividad EDUROAM en Centros Hospitalarios Clínicos del SMS	Finalizado	100,00 %	Finalizado el 25-jul-2019
		Conexión redundante con el Campus de Lorca	Finalizado	100,00 %	Finalizado el 17-jun-2019
Infraestructura en Centros	Proyectos Previstos (Pptos. iniciales 2019)	Grabación autónoma en los 8 salones de actos con mayor uso	Finalizado	100,00 %	Finalizado el 15-oct-2019
		Instalación de 3 estudios para grabación de material docente	En marcha	65,00 %	Estudio de ÁTICA reformado. Adelantadas gestiones para reformas en La Merced y Espinardo.
	Proyectos Previstos (Pptos. iniciales 2019)	Renovación de equipamiento en aulas por valor de 90.000 euros	Finalizado	100,00 %	Finalizado el 25-jul-2019
		Renovación de equipamiento grabaciones multimedia	Finalizado	100,00 %	Finalizado 30-may-2019
		Subtitulación automática de contenido multimedia	Finalizado	100,00 %	Finalizado el 28-ene-2020
		4 aulas de videoapuntes (3 Informática + 1 LAIB)	En marcha	95,00 %	Falta switch de video con 3 salidas (Unidad Técnica).
	Nuevos proyectos (Incorporaciones presupuestarias 2019)	Equipamiento nueva microaula Químicas	Finalizado	100,00 %	Finalizado el 4-feb-2020
		Actualización y renovación Aulas SOCRATES	En marcha	90,00 %	Desplegando
		8 ordenadores SÓCRATES (Escuela Enfermería Cartagena y Servicio de Idiomas)	Finalizado	100,00 %	Instalados
		Actualización MANGEL	Finalizado	100,00 %	Finalizado el 30-ene-2020
		Actualización RUISEÑOR	Finalizado	100,00 %	Finalizado 21-dic-2019
Cargadores Qi		En marcha	90,00 %	Instalando.	
Actualización y renovación de TPS y terminales de cita previa		En marcha	90,00 %	Falta desplegar	
